


Prot: int 119 Ufficio: area Tecnica Lunigiana e Zone Montane

Luogo e data: Capannori 22/1/18

PG/sb

PIANO ATTUATIVO PER L'ANNO 2018 DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA

- P.M.O. -U.I.O. 4 - VALLE DEL SERCHIO

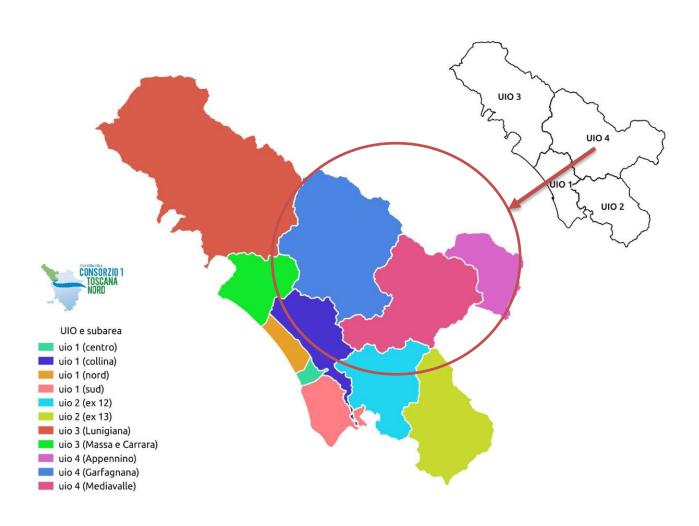

CONSORZIO 1
TOSCANA
NORD

Pagina 2 di 8

RELAZIONE

Questo ufficio, in stretta relazione con i tecnici delle Unioni dei Comuni della Media Valle del Serchio

e della Garfagnana, ha provveduto alla redazione del presente Piano, che segue temporalmente e

concettualmente all'approvazione Piano delle attività di Bonifica anno 2018, approvato con Delibera

dell'Assemblea n. 19 del 27/11/2017.

E' stato inoltre tenuto conto di quanto richiesto dal Presidente con nota di indirizzo prot. INT

2230/2017

In particolare, a partire dal PAB 2018, per ciascun tratto di corso d'acqua per il quale è stato previsto

almeno un intervento di manutenzione nell'anno 2018, oltre alla tipologia di lavoro da eseguire è

stata individuata la modalità di affidamento, distinguendo tra lavori da eseguire in amministrazione

diretta, da affidare direttamente a cooperative o consorzi di cooperative agricolo forestali o aziende

agricole, e infine da affidare mediante procedura negoziata.

In merito all'amministrazione diretta si specifica che i lavori saranno eseguiti dagli operai forestali

in carico alle Unioni dei Comuni della Media Valle, della Garfagnana e dell'Appennino Pistoiese.

Relativamente agli imprenditori agricoli (custodi del territorio), attivi prevalentemente nell'area

geografica dell'Appennino Pistoiese, e alle cooperative agricolo forestali, si comunica che i lotti sono

stati individuati sulla base dei soggetti regolarmente iscritti negli albi consortili, cercando per quanto

possibile di suddividere i lotti di lavori tenendo conto della vicinanza/prossimità con la sede

operativa dei soggetti affidatari, questo comporta il crearsi di innumerevoli vantaggi, tra cui

l'economicità e la conoscenza dettagliata dei luoghi.

• RISORSE ECONOMICHE PMO

Nel seguente schema si riporta la relazione tra bilancio e piano di manutenzione ordinaria e vigilanza

per l'anno di riferimento, dalla quale si evince quanto è stato impegnato per complessivi €

1.130.996,00 che trovano necessaria copertura nei capitoli di Bilancio.

Sede legale: Via della Migliarina, 64 55049 Viareggio (Lu) Centralino: 0584/43.99.1



Pagina 3 di 8

| anno | ART.26 LRT 79/2012 COMMA 2 | BILANCIO | PMO | RISORSE NON IMPEGNATE |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------|
| | A) Manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica di 3°, 4° e 5° categoria | € 1.363.496,00 | € 1.118.496,00 | 245.000,00 |
| | B) Esercizio e vigilanza delle opere di bonifica | € 12.500,00 | € 12.500,00 | 0 |
| | F bis) Manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi canali demaniali di irrigazione | - | - | 0 |
| | TOTALI | € 1.375.996,00 | € 1.130.996,00 | 245.000,00 |
| | | | | |

CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

I criteri generali seguiti per la scelta dei corsi d'acqua su cui fare manutenzione nell'anno in corso sono i comuni criteri di rotazione della manutenzione, tenendo conto di quello che era stato fatto negli anni precedenti, delle segnalazioni raccolte e di quanto emerso a seguito dell'attività di vigilanza in raccordo con le Unioni dei Comuni e le aziende agricole del territorio.

Abbiamo anche cercato di omogeneizzare le aree di intervento, dando evidentemente preferenza ai corsi d'acqua che si trovano in un peggiore stato manutentivo e che interessano zone a maggior rischio idraulico, individuati anche sulla base delle segnalazioni degli enti attivi sul territorio. Dando priorità agli aspetti legati alla sicurezza idraulica e al regolare deflusso, ma senza tralasciare la "percezione comune" del rischio idraulico e della presenza di vegetazione, che spesso viene valutata solo per l'impatto visivo che produce, soprattutto in periodi vegetativi in cui il fogliame è particolarmente rigoglioso.

I lavori si suddividono essenzialmente in tagli vegetazionali, intesi come sfalci e pulizia degli alvei dalla vegetazione infestante erbacea/arbustiva; taglio piante selettivo, ovvero rimozione della vegetazione arborea, che per stato di salute, posizione e dimensioni, potrebbe essere asportata dalla corrente in caso di piena e costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque, con particolare attenzione alla presenza di attraversamenti infrastrutturali, restringimenti di sezione o tratti



Pagina 4 di 8

intubati. Sono previsti anche interventi di risagomatura e ricentramento degli alvei e manutenzione di alcune opere longitudinali e puntuali esistenti, usurate dal tempo, dall'azione erosiva della corrente e del relativo trasporto solido.

Sulla porzione di reticolo non posto in manutenzione nell'anno 2018 è comunque prevista, come evidenziato dalle tavole allegate, l'attività di vigilanza, che verrà svolta dagli operai in carico alle Unioni dei Comuni e dai tecnici consortili e dell'Unione dei Comuni della Media Valle e Garfagnana durante le normali attività di sopralluogo dei cantieri di manutenzione ordinaria e durante tutto l'anno a seguito di segnalazioni di enti o cittadini.

Le percentuali di ripartizione delle modalità di affidamento dei lavori sono state osservate e evidenziate di seguito.

PMO – LAVORI IN APPALTO

Sulla base dei criteri sopra indicati, è stata stilata la relativa suddivisione. Si sono così ottenuti n. 29 progetti sui corsi d'acqua della U.I.O., di seguito riportati con il relativo importo lordo e con indicate in linea di massima le date di inizio e fine lavori:

AREA APPENNINO PISTOIESE

| Lotto | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|------------|---------------|-------------|--------|
| | Bacino | | Importo | Inizio lavori | Fine lavori | % |
| Amministrazione | | | | | | |
| diretta Lotto 1 | Limestre, Lima Origini | € | 100.537,83 | Luglio | Novembre | |
| Totale | | | | | | |
| amministrazion | | | | | | |
| e diretta | | € | 100.537,83 | | | 45,70% |
| aziende agricole | | | | | | |
| Abetone | | | | | | |
| Cutigliano lotto | | | | | | |
| 1 | Lima Origini | € | 46.833,11 | Luglio | Settembre | |
| aziende agricole | | | | | | |
| S.Marcello | | | | | | |
| Piteglio lotto 2 | Limestre | € | 6.697,26 | Luglio | Agosto | |
| aziende agricole | | | | | | |
| S.marcello | | | | | | |
| Piteglio lotto 3 | Limestre | € | 7.905,42 | Luglio | Agosto | |
| aziende agricole | | | | | | |
| S.marcello | | | | | | |
| Piteglio lotto 4 | Limestre | € | 8.597,48 | Luglio | Agosto | |
| | | | | | | |



Pagina 5 di 8

| Totale aziende agricole e cooperative | | € | 70.033,27 | | | 31,83 |
|--|----------|---|------------|--------|-----------|--------|
| Ditte o aziende agricole del settore | | | | | | |
| aziende agricole o ditte del settore lotto 1 | Limestre | € | 17.000,00 | Luglio | Agosto | |
| aziende agricole o ditte del settore lotto 2 | Limestre | € | 32.428,90 | Luglio | Settembre | |
| Totale appalto | | € | 49.428,90 | | | 22,50% |
| Totale apparto complessivo | | € | 220.000,00 | | | 22,30% |

AREA GARFAGNANA

| | | | | | | % |
|-----------------|---------------------|----|------------|---------------|-------------|---|
| Lotto | Bacino | lm | porto | Inizio lavori | Fine lavori | |
| | Acqua Bianca, | | | | | |
| | Aulella Origini, | | | | | |
| | Ceserano, Corfino, | | | | | |
| | Edron, Serchio di | | | | | |
| Amministrazione | Sillano, Turrite | | | | | |
| diretta Lotto 1 | Secca | € | 61.444,44 | Luglio | Settembre | |
| | Acqua Bianca, | | | | | |
| | Aulella Origini, | | | | | |
| | Edron, Serchio di | | | | | |
| | Sillano, Turrite di | | | | | |
| Amministrazione | Gallicano, Turrite | | | | | |
| diretta Lotto 2 | Secca | € | 104.754,65 | Luglio | Novembre | |
| Amministrazione | | | | | Novembre | |
| diretta Lotto 3 | Ceserano, Corfino | € | 73.884,05 | Luglio | | |
| Amministrazione | | | | | Novembre | |
| diretta Lotto 4 | | | | | | |
| Vigilanza | Tutti | € | 9.712,54 | Febbraio | | |



Pagina 6 di 8

| | | | | | | 60 50 |
|--------------------|-----------------------|---|------------|---------|---------|--------|
| Totale | | | | | | 60,7% |
| amministrazione | | | | | | |
| diretta | | € | 249.795,68 | | | |
| Aziende agricole e | | | | | | |
| cooperative Lotto | | | | | | |
| 1 | Turrite di Gallicano | € | 17.175,60 | Luglio | Agosto | |
| Aziende agricole e | | | | | | |
| cooperative Lotto | Turrite di Gallicano, | | | | | |
| 2 | Turrite Secca | € | 39.276,36 | Luglio | Agosto | |
| Aziende agricole e | | | | | | |
| cooperative Lotto | Turrite di Gallicano, | | | | | |
| 3 | Turrite Secca | € | 3.846,96 | Luglio | Agosto | |
| Aziende agricole e | | | | | | |
| cooperative Lotto | | | | | | |
| 4 | Edron | € | 20.001,24 | Luglio | Agosto | |
| Totale aziende | | | | | | 21,6% |
| agricole e | | | | | | |
| cooperative | | € | 80.300,16 | | | |
| Cooperative | Serchio di Sillano, | | | | | |
| sociali Lotto 1 | Corfino | € | 8.708,76 | Luglio | Agosto | |
| Totale | | | | | | 5,4% |
| cooperative | | | | | | |
| sociali | | € | 8.708,76 | | | |
| Appalto Lotto 1 | | | - | | | |
| Fiume Serchio | | | | | | |
| Piazza al Serchio | Serchio di Sillano | € | 17.146,00 | Luglio | Agosto | |
| Appalto Lotto 2 | | | • | | J | |
| Fosso Finocchini | | | | | | |
| Fabbriche di | | | | | | |
| Vallico | Turrite di Gallicano | € | 15.000,00 | Luglio | Agosto | |
| Appalto Lotto 3 | | | • | | | |
| Lago di | | | | | | |
| Gramolazzo | Acqua Bianca | € | 20.854,00 | Luglio | Agosto | |
| Appalto Lotto 4 | 4 | Ť | , | 10.5 | 03333 | |
| Fiume Serchio | | | | | | |
| Castelnuovo di | | | | | | |
| Garfagnana | Fiume Serchio | € | 20.000,00 | Luglio | Agosto | |
| Totale appalto | | € | 73.000,00 | -5.0.70 | 1.63515 | 17,7% |
| Totale apparto | | | 70.000,00 | | | 21,770 |
| complessivo | | £ | 411.804,60 | | | |
| complessivo | | C | 711.004,00 | | | |



Pagina 7 di 8

AREA MEDIA VALLE del SERCHIO

| AREA MEDIA VALLE | | | Inizio | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|-------------|---------|
| Lotto | Bacino | Importo | lavori | Fine lavori | % |
| Amministrazione | | | | Novembre | |
| diretta Lotto 1 | Loppora | € 47.606,31 | Marzo | | |
| Amministrazione | Pizzorna, Fegana, | | | Novembre | |
| diretta Lotto 2 | Scesta | € 70.963,73 | Marzo | | |
| | Pizzorna, Socciglia, | | | Novembre | |
| Amministrazione | Celetra, Turrite di | | | | |
| diretta Lotto 3 | Gallicano | € 62.000,63 | Marzo | | |
| Amministrazione | | | | Novembre | |
| diretta Lotto 4 | Loppora, Fegana | € 45.833,71 | Marzo | | |
| Amministrazione | Turrite di Gallicano, | | | Novembre | |
| diretta Lotto 5 | Pedogna | € 38.595,62 | Marzo | | |
| Amministrazione | | | | Novembre | |
| diretta Lotto 6 | | 6 42 500 00 | | | |
| Vigilanza | Tutti | € 12.500,00 | Marzo | | |
| Totale amministrazione | | | | | |
| diretta | | € 277.500,00 | | | 55,56% |
| Aziende agricole e | | 2771300,00 | | | 33,3370 |
| cooperative Lotto | | | | | |
| 1 Fiume Serchio | Fiume Serchio | € 99.691,40 | Agosto | Settembre | |
| Totale aziende | Trame Seremo | 2 33.031,40 | 7180310 | Settembre | |
| agricole e | | | | | |
| cooperative | | € 99.691,40 | | | 20% |
| Appalto Lotto 1 | | | | | |
| manutenzione | | | | | |
| opere nei Comuni | | | | | |
| dell'Unione | | | | | |
| Mediavalle | Vari | € 82.000,00 | Luglio | Settembre | |
| | | | | | |
| Appalto Lotto 2 | | | | | |
| Fiume Serchio | | | | | |
| Borgo a Mozzano | Fiume Serchio | € 40.000,00 | Luglio | Settembre | |
| Totale appalto | | € 122.000,00 | | | 24,44% |
| Totale | | 6 400 404 40 | | | |
| complessivo | | € 499.191,40 | | | |



Pagina 8 di 8

I lavori in appalto del Lotto 1 Comuni vari verrà progettato e pianificato entro giugno 2018 al fine di poter dare tempestiva risposta alle segnalazioni raccolte durante i primi 6 mesi dell'anno.

• PMO – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Nella tabella seguente si riporta una stima del numero medio di operai da impiegare per l'esecuzione dei lavori programmati in amministrazione diretta (il costo totale comprende il 25% di maggiorazione per quantificare materiale di consumo, carburante e ammortamento mezzi):

| IMPORTO DI MAS | SIMA FABBIS | OGNO PE | ER AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | | | |
|--|----------------|---------|----------------------------|--------------|--|--|--|
| | n. operai | mesi | costo mensile medio | Costo | | | |
| operai n. | 50 | 3 | € 2.500,00 | € 375.000,00 | | | |
| operai n. | 25 | 3 | € 2.500,00 | € 187.500,00 | | | |
| operai n. (*) | - | - | € 2.500,00 | - | | | |
| materiale di consun | no, carburante | ecc. | 25% | € 140.625,00 | | | |
| (*) n. x operai impiegati per x mesi su impianti irrigui | | | | | | | |

Si allegano le seguenti cartografie:

- la *Tavola 1*, che riporta per ciascun corso d'acqua in manutenzione la tipologia di lavoro previsto (sfalcio, taglio piante, manutenzione opere, movimento materiale);
- la *Tavola 2*, che riporta per ciascun corso d'acqua in manutenzione la modalità di affidamento;
- la *Tavola 3*/4/5 che riportano specificamente, rispettivamente per la zona della Garfagnana, Media Valle e Appennino P.se l'ipotesi di suddivisione in lotti.

In merito agli elaborati grafici si specifica che si è ritenuto preferibile non utilizzare come sfondo cartografico la CTR, in quanto l'ampiezza dell'area da rappresentare avrebbe reso inintelligibile la mappa. Si è pertanto utilizzata la medesima base cartografica degli elaborati del *Piano delle attività di bonifica 2018*, più idoneo a rappresentare la U.I.O. 4 –Valle del Serchio, rimandando alla fase di progettazione definitiva/esecutiva la rappresentazione di dettaglio in scala 1:10.000 dei tratti oggetto di manutenzione su Carta tecnica regionale.

Si allegano inoltre gli elaborati tabellari redatti a partire dallo schema B del *Piano delle attività di bonifica 2018*, in cui sono elencate, per ciascun tratto in manutenzione, le informazioni riportate in maniera sintetica negli elaborati grafici e nelle tabelle della presente relazione.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA LUNIGIANA E AREE MONTANE

Dott. Agron. Pamela Giani
